

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1er trimestre												2º trimestre			3er trimestre			4º trimestre			1er trimestre	
					dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb								
0		PTU Colsein Ltda	260 días?	jue 10/01/13																							
1		Inicio del Proyecto	0 días	jue 10/01/13																							
2		Planeación	7 días?	jue 10/01/13																							
3		Definición del alcance del proyecto	0,5 días	jue 10/01/13																							
4		Definición del Equipo de	1 día	jue 10/01/13																							
5		Definición de los Recursos Materiales	0,5 días	vie 11/01/13																							
6		Definición de costos y presupuestos	1 día	lun 14/01/13																							
7		Planeación de compras	1 día?	mar 15/01/13																							
8		Planeación de actividades	1 día	mié 16/01/13																							
9		Revisión del plan inicial	1 día	jue 17/01/13																							
10		Análisis de Riesgos	1 día	vie 18/01/13																							
11		Compras	90 días	jue 10/01/13																							

Proyecto: PTU Colsein Ltda.mp Fecha: jue 26/03/15	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1er trimestre			2º trimestre			3er trimestre			4º trimestre			1er trimestre	
					dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene
12		Evaluación, selección y contratación de contratistas Metalmecánicos	1 día	mié 16/01/13														
13		Evaluación, selección y contratación de contratistas eléctricos	1 día	jue 17/01/13														
14		Evaluación, selección y contratación de proveedores de materiales de obra civil	1 día	vie 18/01/13														
15		Evaluación, selección y contratación de contratistas de automatización	1 día	lun 21/01/13														
16		Negociación con proveedor de Energía Eléctrica de la región	60 días	jue 10/01/13														

Proyecto: PTU Colsein Ltda.mp Fecha: jue 26/03/15	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1er trimestre		2º trimestre			3er trimestre			4º trimestre			1er trimestre	
					dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
17		Importación equipos donados por las marcas	90 días	jue 10/01/13		[Barra azul continua]											
18		Fin Planeación - Inicio Ejecución	0 días	jue 16/05/13													
19		Implementación Partes Metalmecánicas	35 días	jue 17/01/13		[Barra negra]											
20		Fabricación Tanques de Almacenamiento	20 días	jue 17/01/13		[Barra azul]											
21		Fabricación de tuberías	20 días	jue 17/01/13		[Barra azul]											
22		Fabricación de soportes	10 días	jue 14/02/13			[Barra azul]										
23		Montaje e instalación de partes en sitio	5 días	jue 28/02/13				[Barra azul]									
24		Implementación partes Eléctricas	56 días	vie 18/01/13		[Barra negra]											
25		Instalación acometida eléctrica de media tensión	5 días	lun 25/03/13													




Proyecto: PTU Colsein Ltda.mp Fecha: jue 26/03/15	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

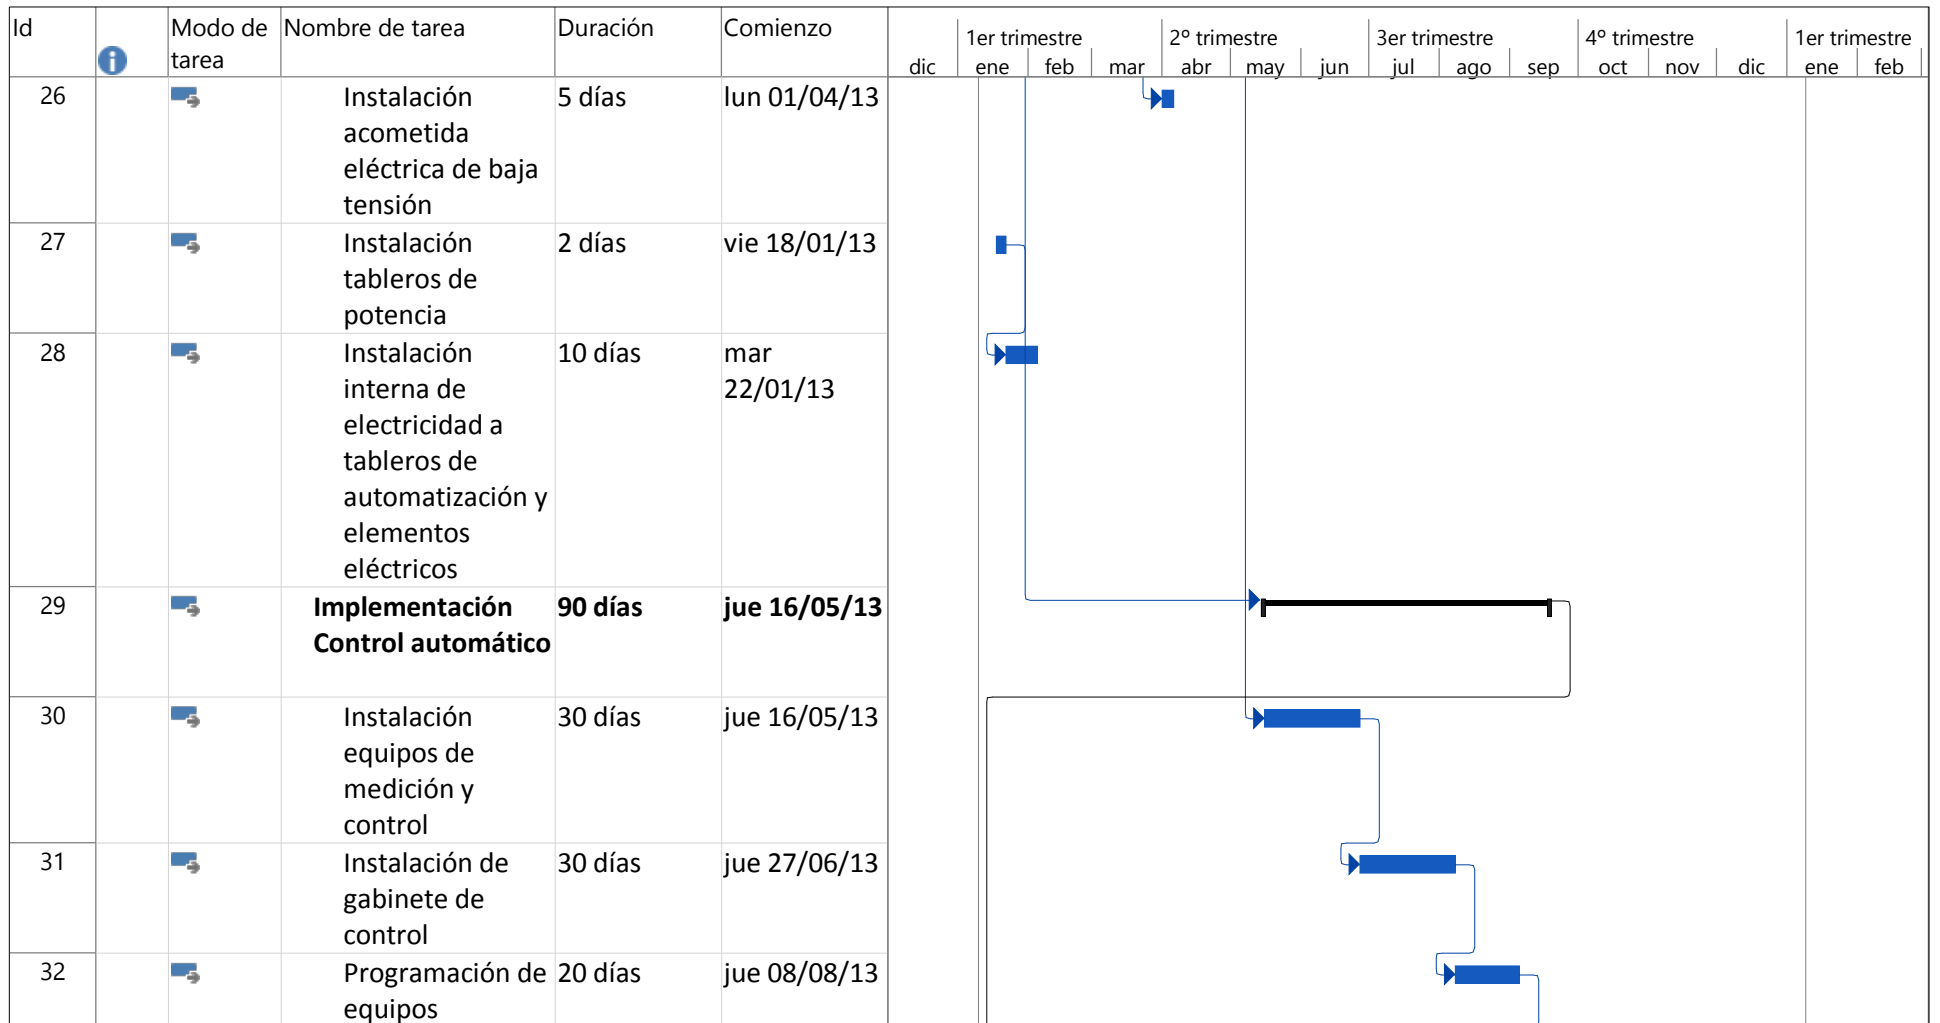

Proyecto: PTU Colsein Ltda.mp
 Fecha: jue 26/03/15

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

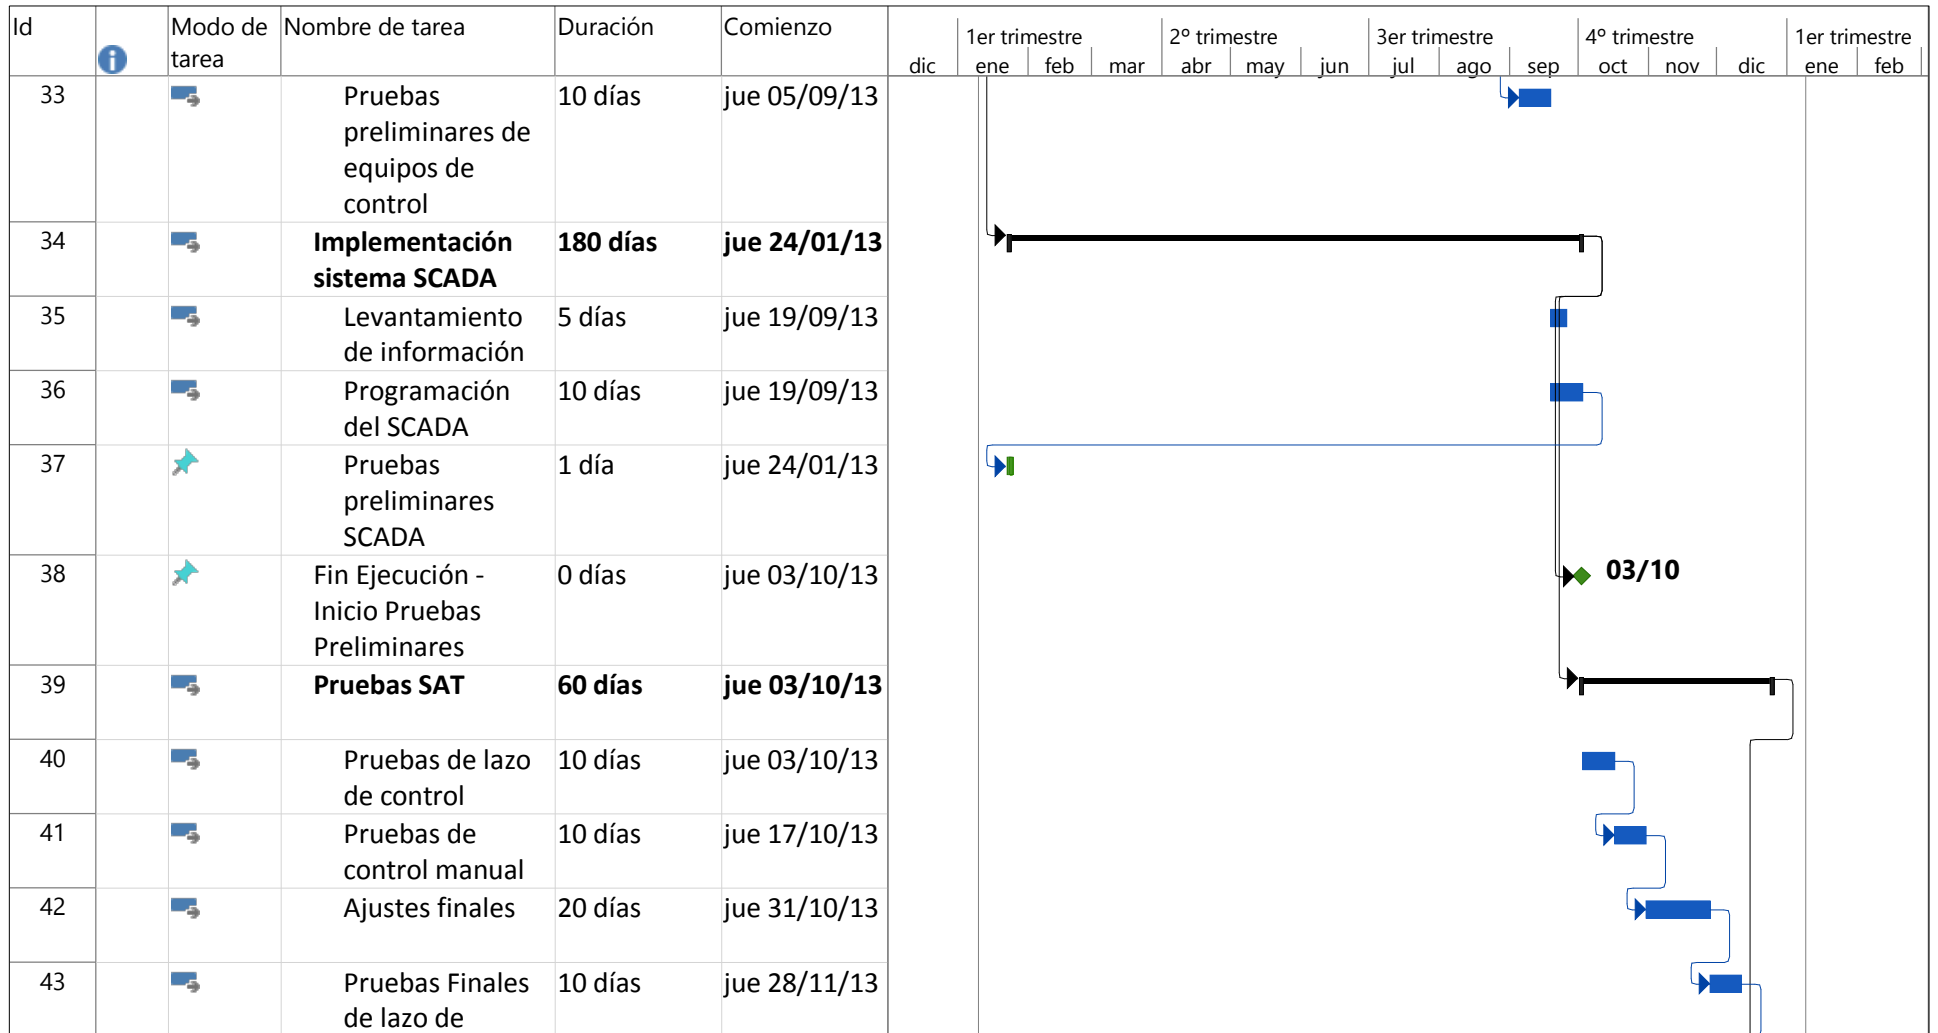

Proyecto: PTU Colsein Ltda.mp Fecha: jue 26/03/15	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	1er trimestre												2° trimestre			3er trimestre			4º trimestre			1er trimestre									
					dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	dic	ene	feb	dic	ene	feb										
44		Pruebas finales de control	10 días	jue 12/12/13																															
45		Puesta en marcha	2 días	jue 26/12/13																															
46		Documentación borrador	250 días	jue 10/01/13																															
47		Toma de registros y fotos	250 días	jue 10/01/13																															
48		Documentación Final	10 días	jue 26/12/13																															

Proyecto: PTU Colsein Ltda.mp
Fecha: jue 26/03/15

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
