


### Cronograma plan implementacion ALVILLA

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	28 sep '25							5 oct '25							12 oct '25						
								S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
1			<b>Plan de implementac</b>	<b>237 días</b>	<b>dom 28/09/2</b>	<b>mar 25/08/2</b>																						
2			<b>Fase 1: Inicio</b>	<b>29 días</b>	<b>dom 28/09/2</b>	<b>jue 6/11/25</b>																						
3			Evaluación situa	15 días	dom 28/09/2	jue 16/10/25																						
4			Aplicación encue	15 días	vie 17/10/25	jue 6/11/25	3																					
5			<b>Fase 2: Planificació</b>	<b>58 días</b>	<b>vie 7/11/25</b>	<b>mar 27/01/2</b>																						
6			Diseño detallad	30 días	vie 7/11/25	jue 18/12/25	4																					
7			Construcción de	15 días	vie 19/12/25	jue 8/01/26	6																					
8			Elaboración del	7 días	vie 19/12/25	lun 29/12/25	6																					
9			Presentación de	7 días	mar 30/12/25	mié 7/01/26	8																					
10			Revisión y aprob	7 días	jue 8/01/26	vie 16/01/26	9																					
11			Definición del ec	7 días	lun 19/01/26	mar 27/01/26	10																					
12			Socialización al e	7 días	lun 19/01/26	mar 27/01/26	10																					
13			<b>Fase 3: Ejecución</b>	<b>92 días</b>	<b>mié 28/01/2</b>	<b>jue 4/06/26</b>																						
14			Diseño de esque	15 días	mié 28/01/26	mar 17/02/26	12																					
15			Comunicación y	7 días	mié 18/02/26	jue 26/02/26	14																					
16			Búsqueda de ali	7 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	15																					
17			Implementación	63 días	mar 10/03/26	jue 4/06/26	16																					
18			Primera entrega	7 días	mar 10/03/26	mié 18/03/26	16																					
19			<b>Fase 4: Seguimient</b>	<b>100 días</b>	<b>vie 27/02/26</b>	<b>jue 16/07/26</b>																						
20			Ejecución progre	15 días	vie 5/06/26	jue 25/06/26	17																					

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



## Cronograma plan implementacion ALVILLA

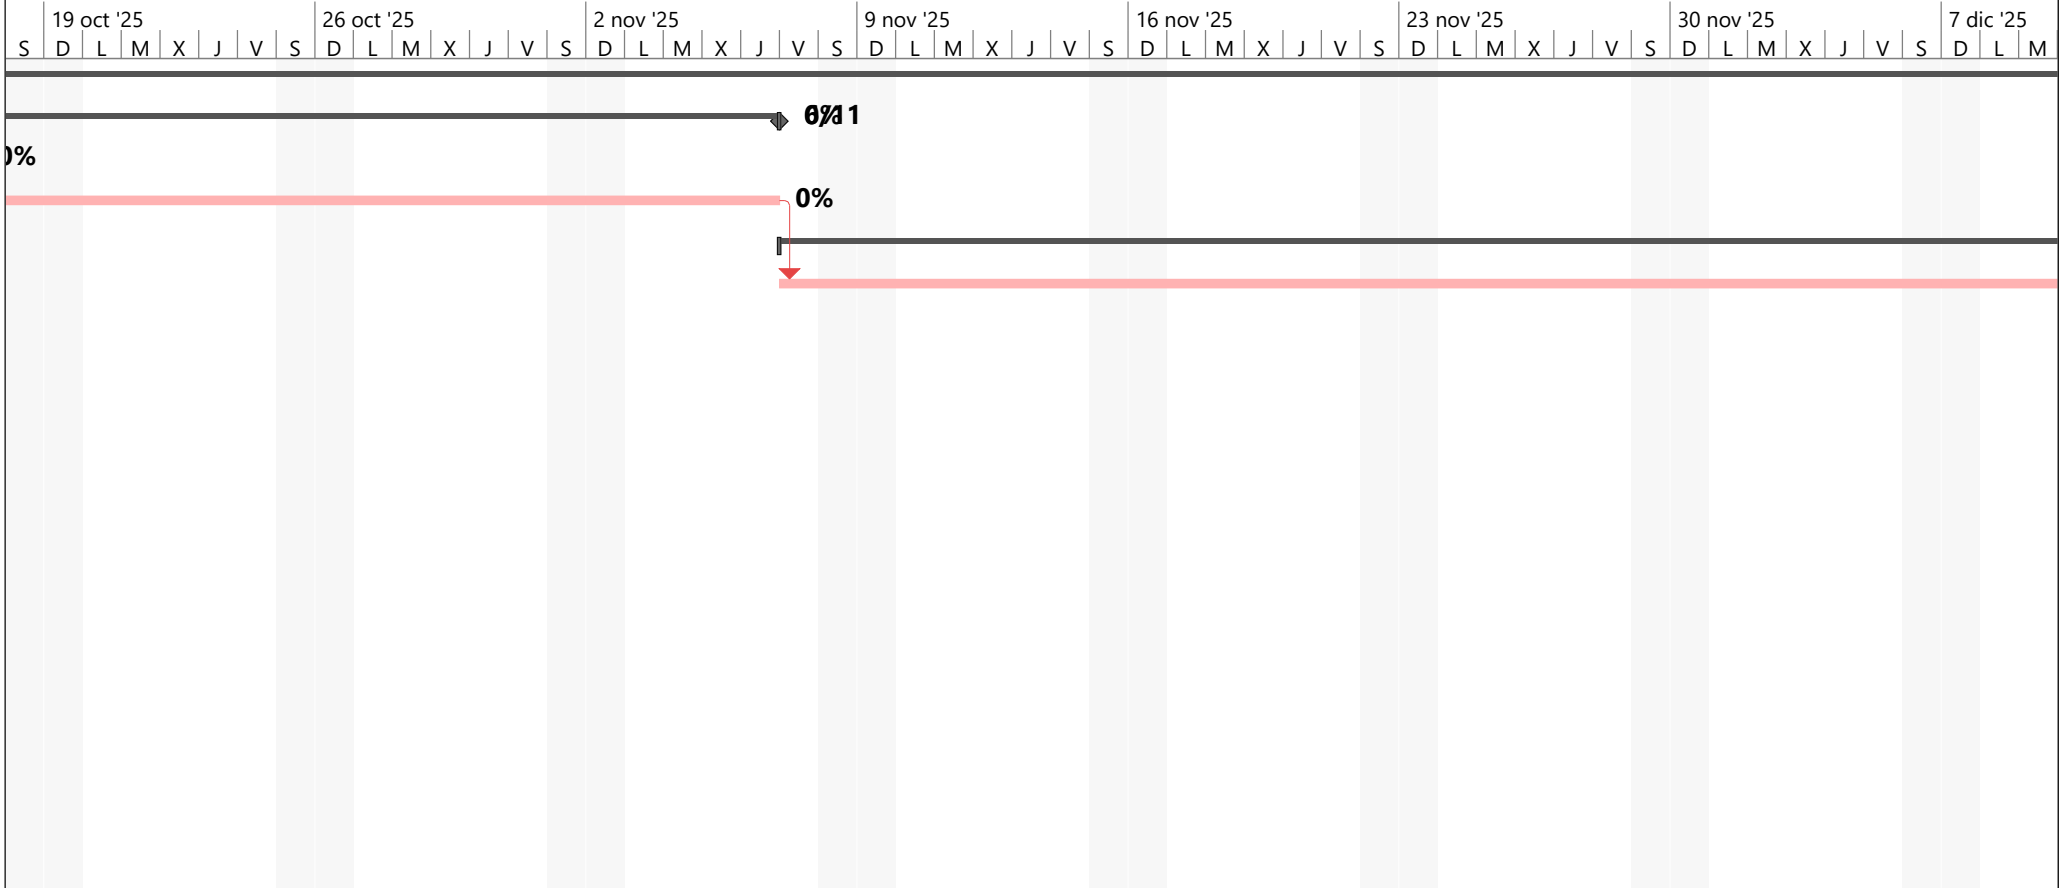


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	



# Cronograma plan implementacion ALVILLA


X J V S | 14 dic '25 | D L M X J V S | 21 dic '25 | D L M X J V S | 28 dic '25 | D L M X J V S | 4 ene '26 | D L M X J V S | 11 ene '26 | D L M X J V S | 18 ene '26 | D L M X J V S | 25 ene '26 | D L M X J V S

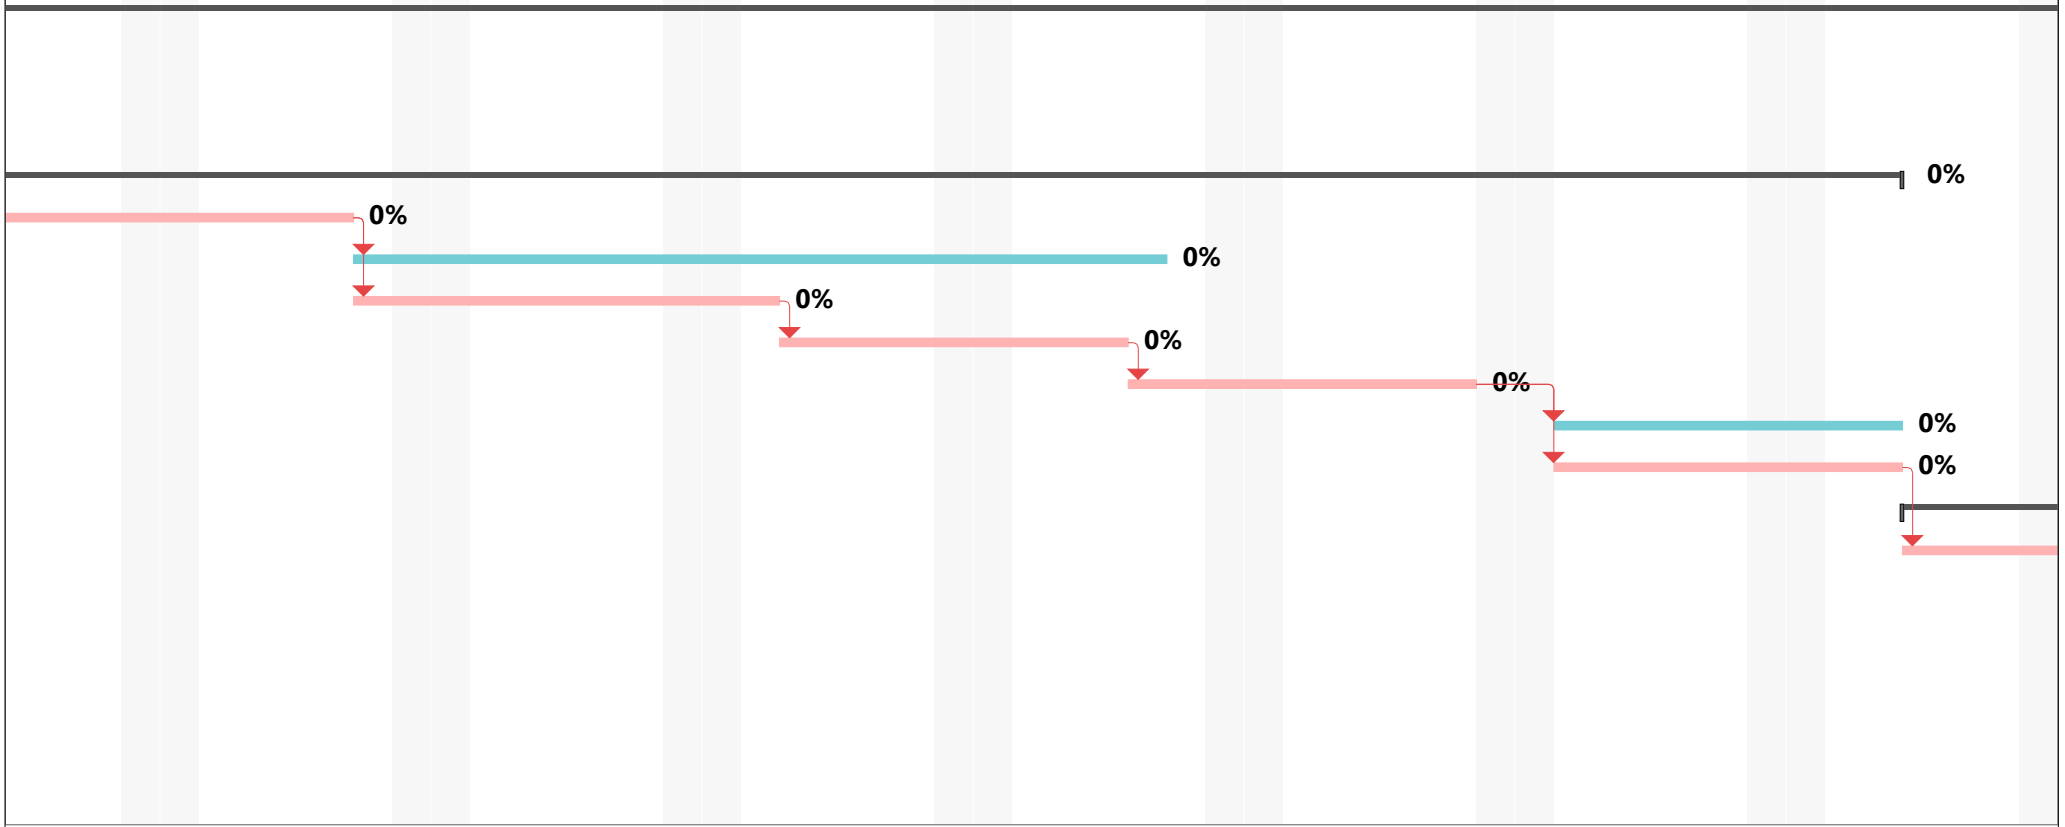

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Cronograma plan implementacion ALVILLA


X J V S | 14 dic '25 | X J V S | 21 dic '25 | X J V S | 28 dic '25 | X J V S | 4 ene '26 | X J V S | 11 ene '26 | X J V S | 18 ene '26 | X J V S | 25 ene '26

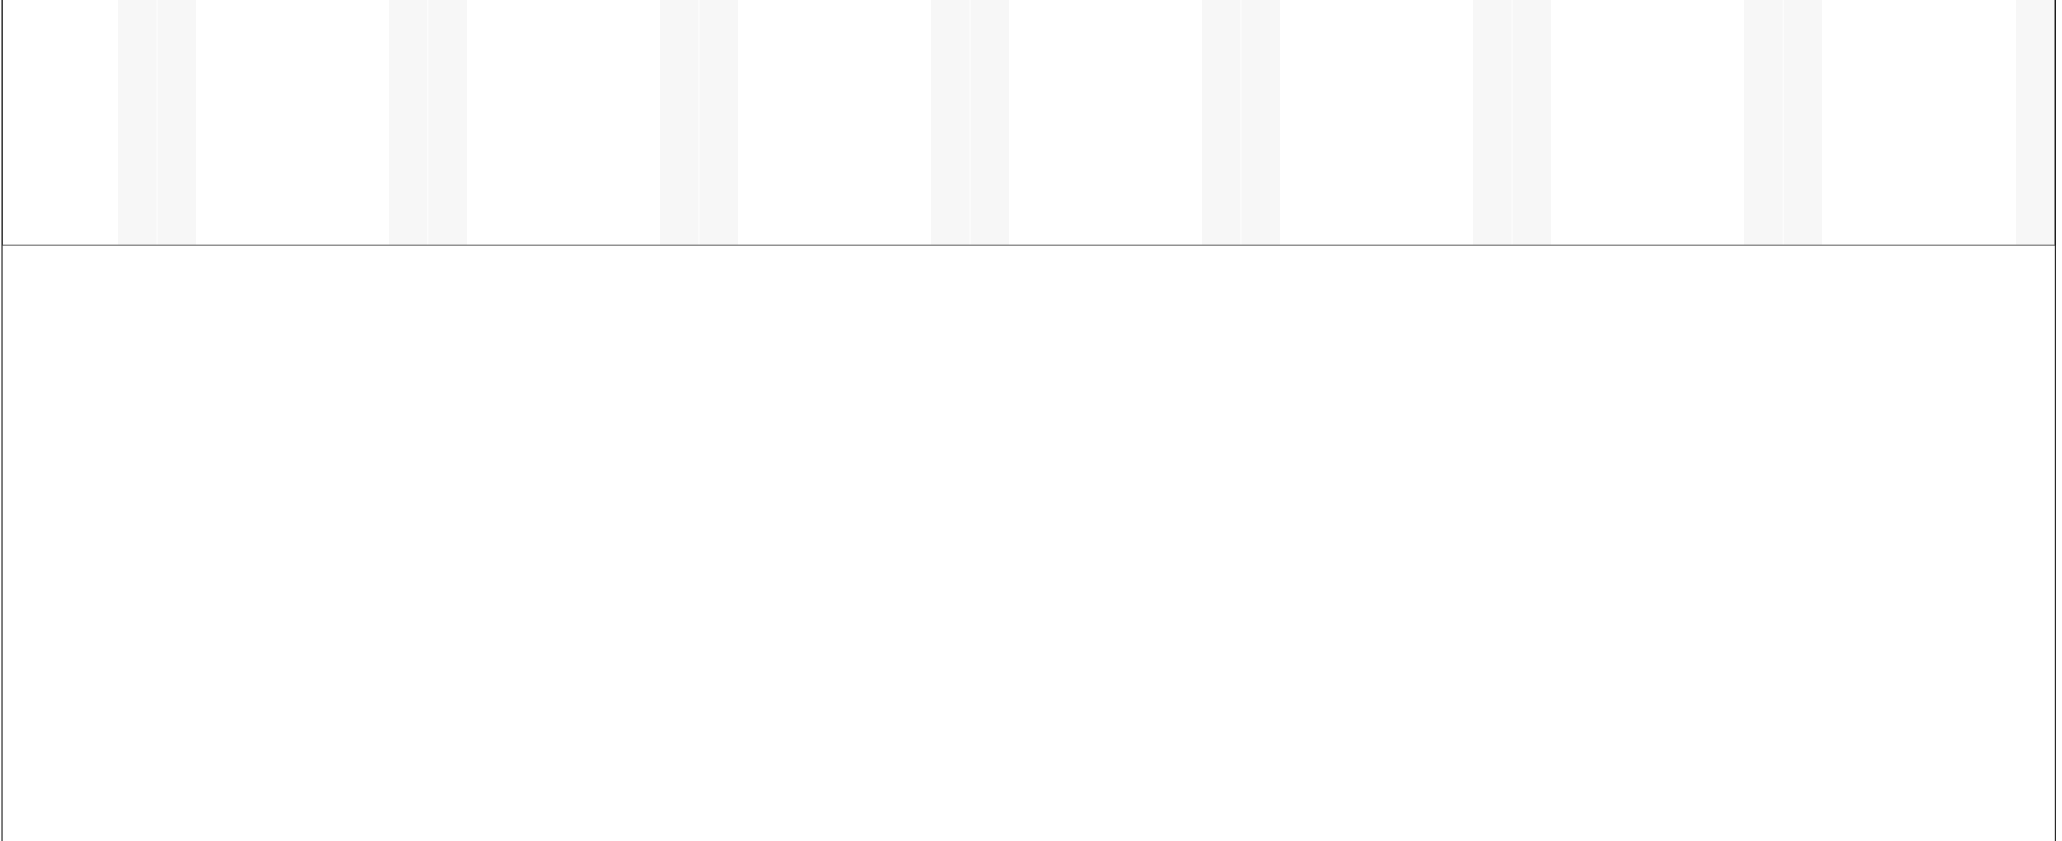

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Cronograma plan implementacion ALVILLA


1 feb '26      8 feb '26      15 feb '26      22 feb '26      1 mar '26      8 mar '26      15 mar '26      22 mar '26  
 D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X

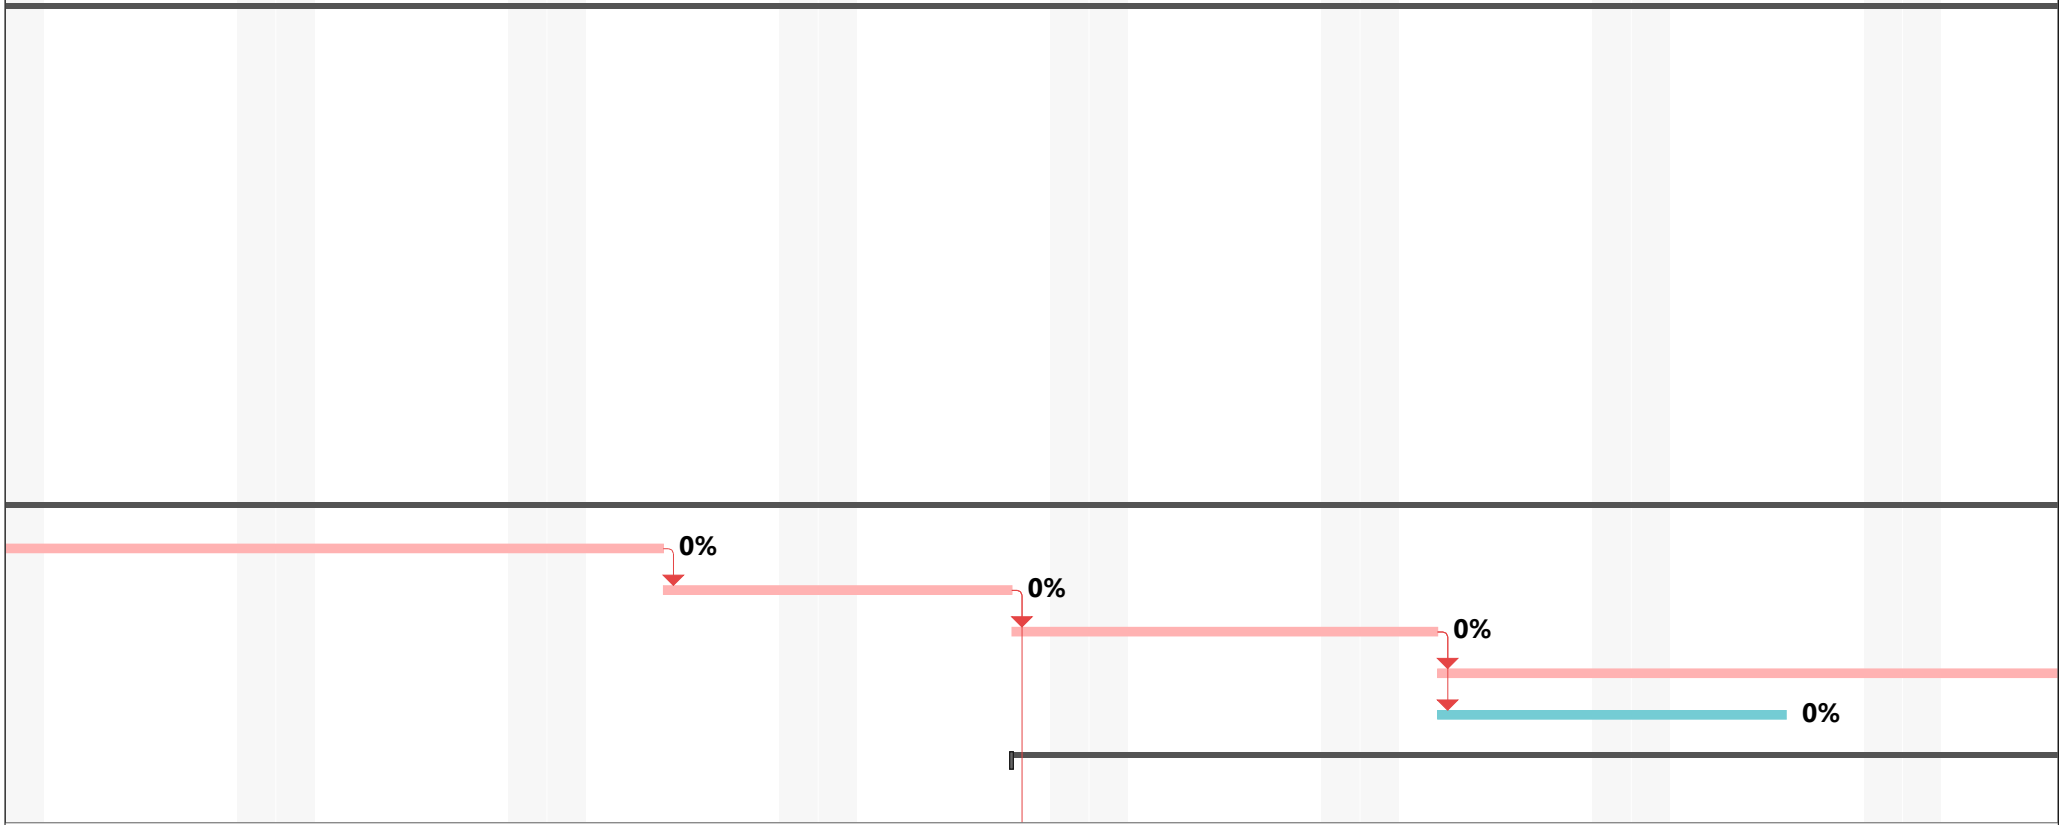

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

### Cronograma plan implementacion ALVILLA


1 feb '26      8 feb '26      15 feb '26      22 feb '26      1 mar '26      8 mar '26      15 mar '26      22 mar '26  
 D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Cronograma plan implementacion ALVILLA


J V S | 29 mar '26 | 5 abr '26 | 12 abr '26 | 19 abr '26 | 26 abr '26 | 3 may '26 | 10 may '26 | 17  
 D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D L M X J V S | D



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

## Cronograma plan implementacion ALVILLA


J V S | 29 mar '26 | D L M X J V S | 5 abr '26 | D L M X J V S | 12 abr '26 | D L M X J V S | 19 abr '26 | D L M X J V S | 26 abr '26 | D L M X J V S | 3 may '26 | D L M X J V S | 10 may '26 | D L M X J V S | 17 D



Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


## Cronograma plan implementacion ALVILLA

may '26 | 24 may '26 | 31 may '26 | 7 jun '26 | 14 jun '26 | 21 jun '26 | 28 jun '26 | 5 jul '26  
 L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J

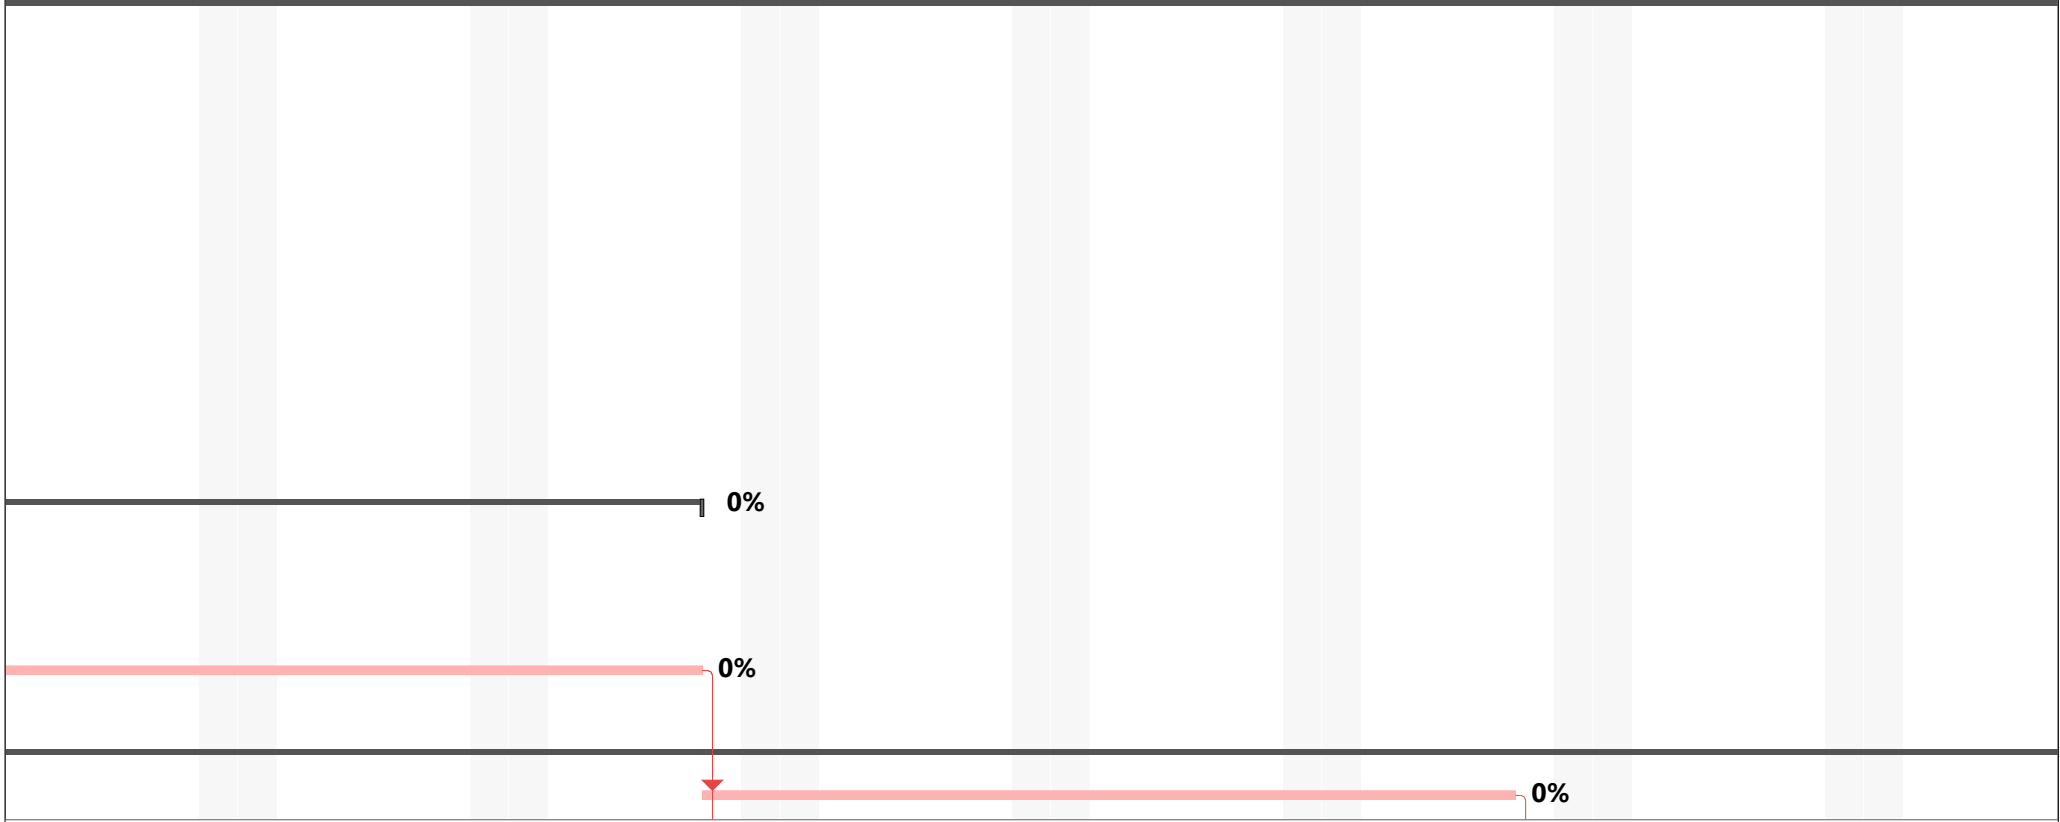


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

### Cronograma plan implementacion ALVILLA

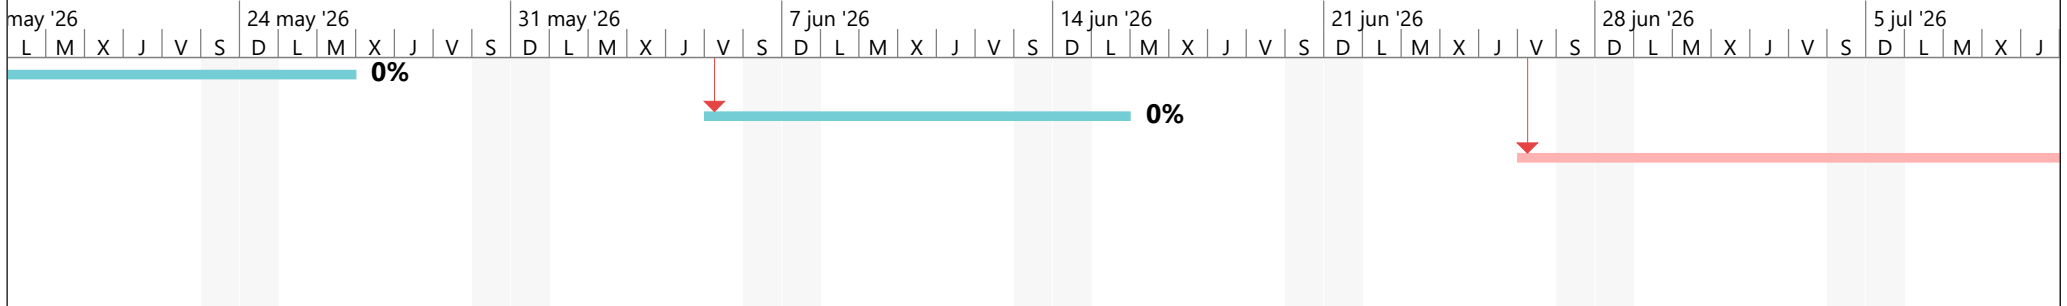


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

### Cronograma plan implementacion ALVILLA

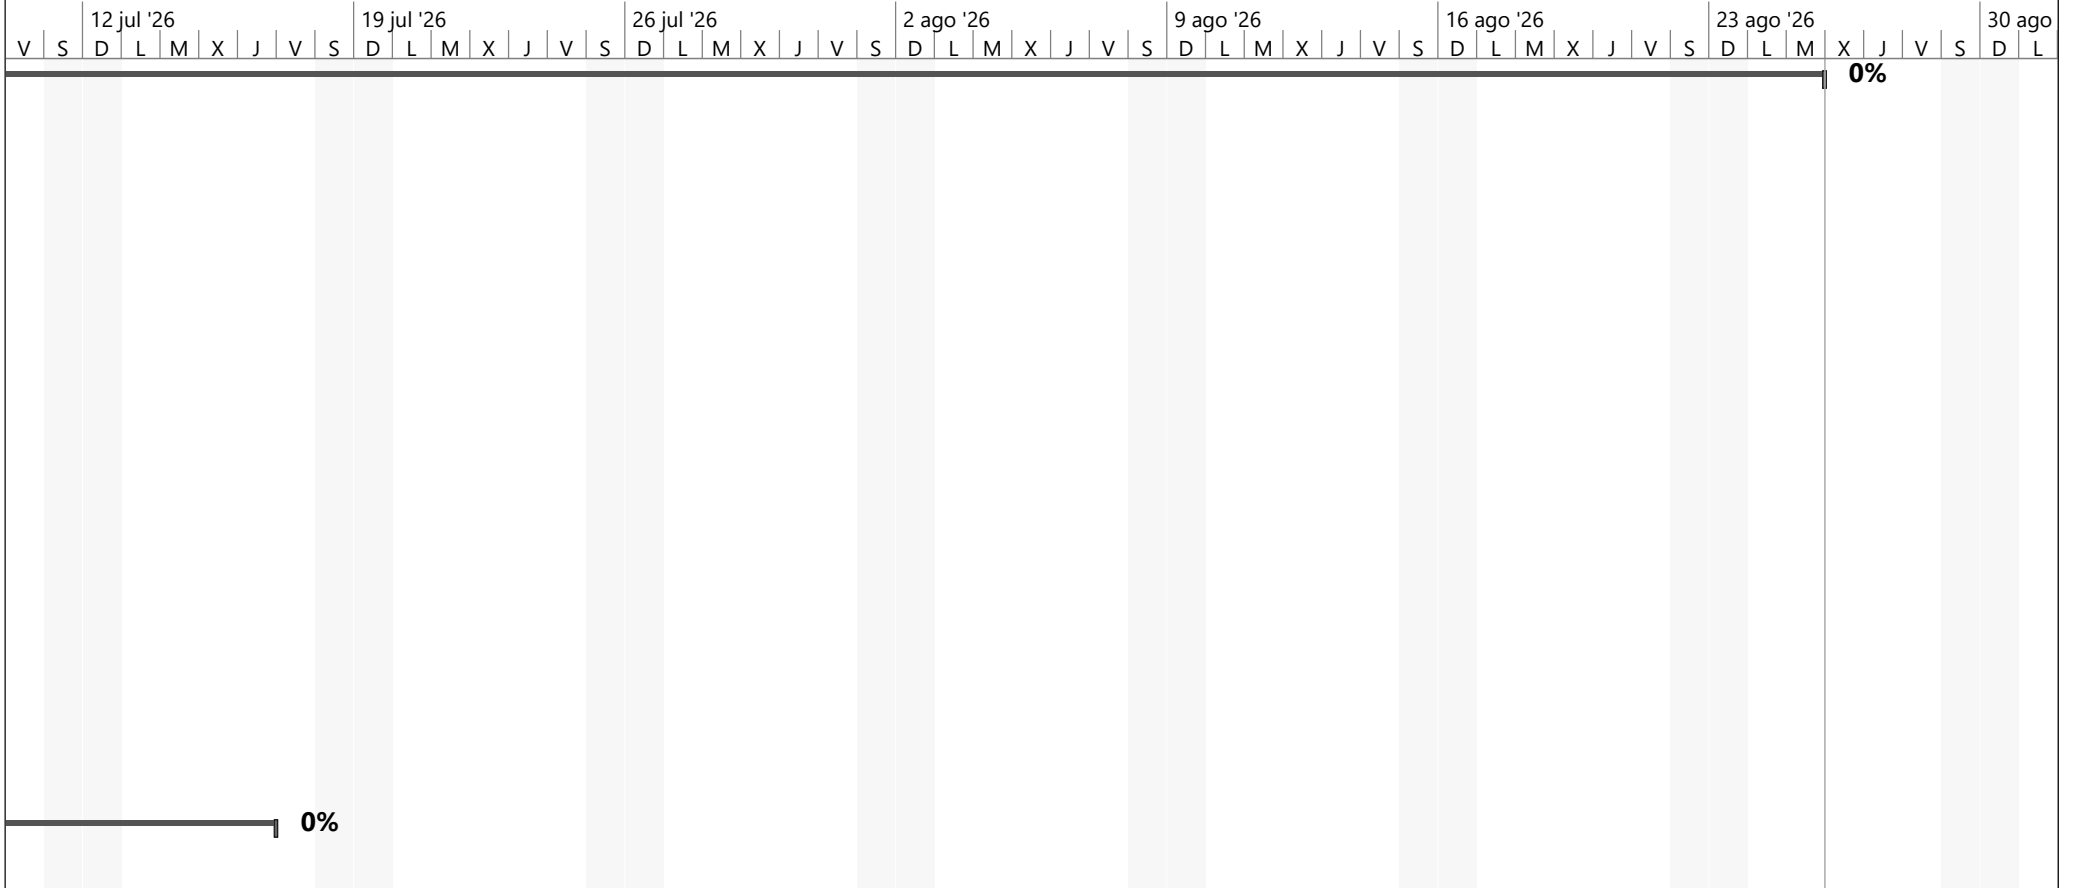

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

### Cronograma plan implementacion ALVILLA

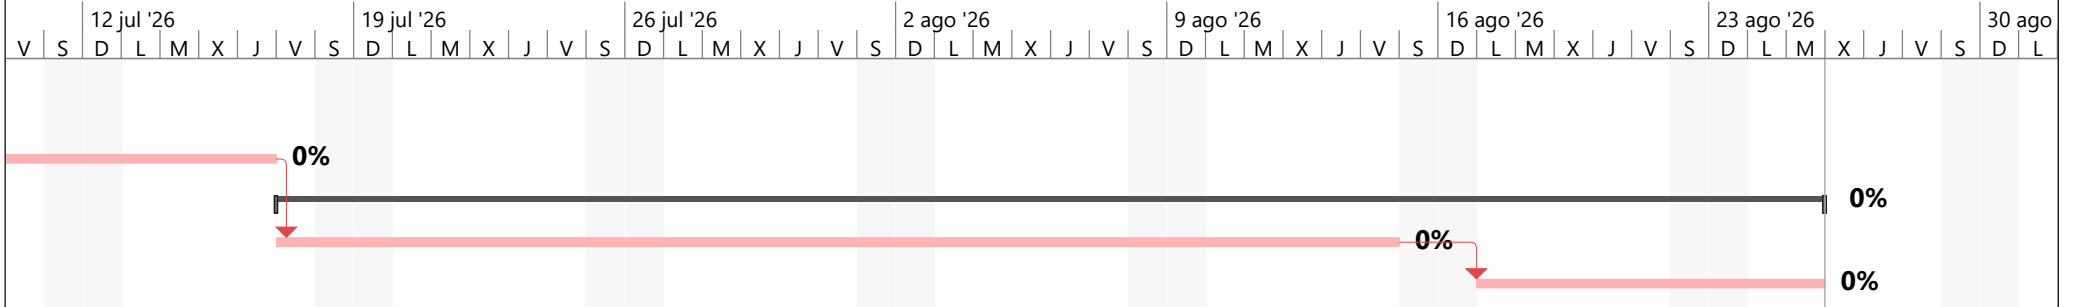

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	
