# Anexo D

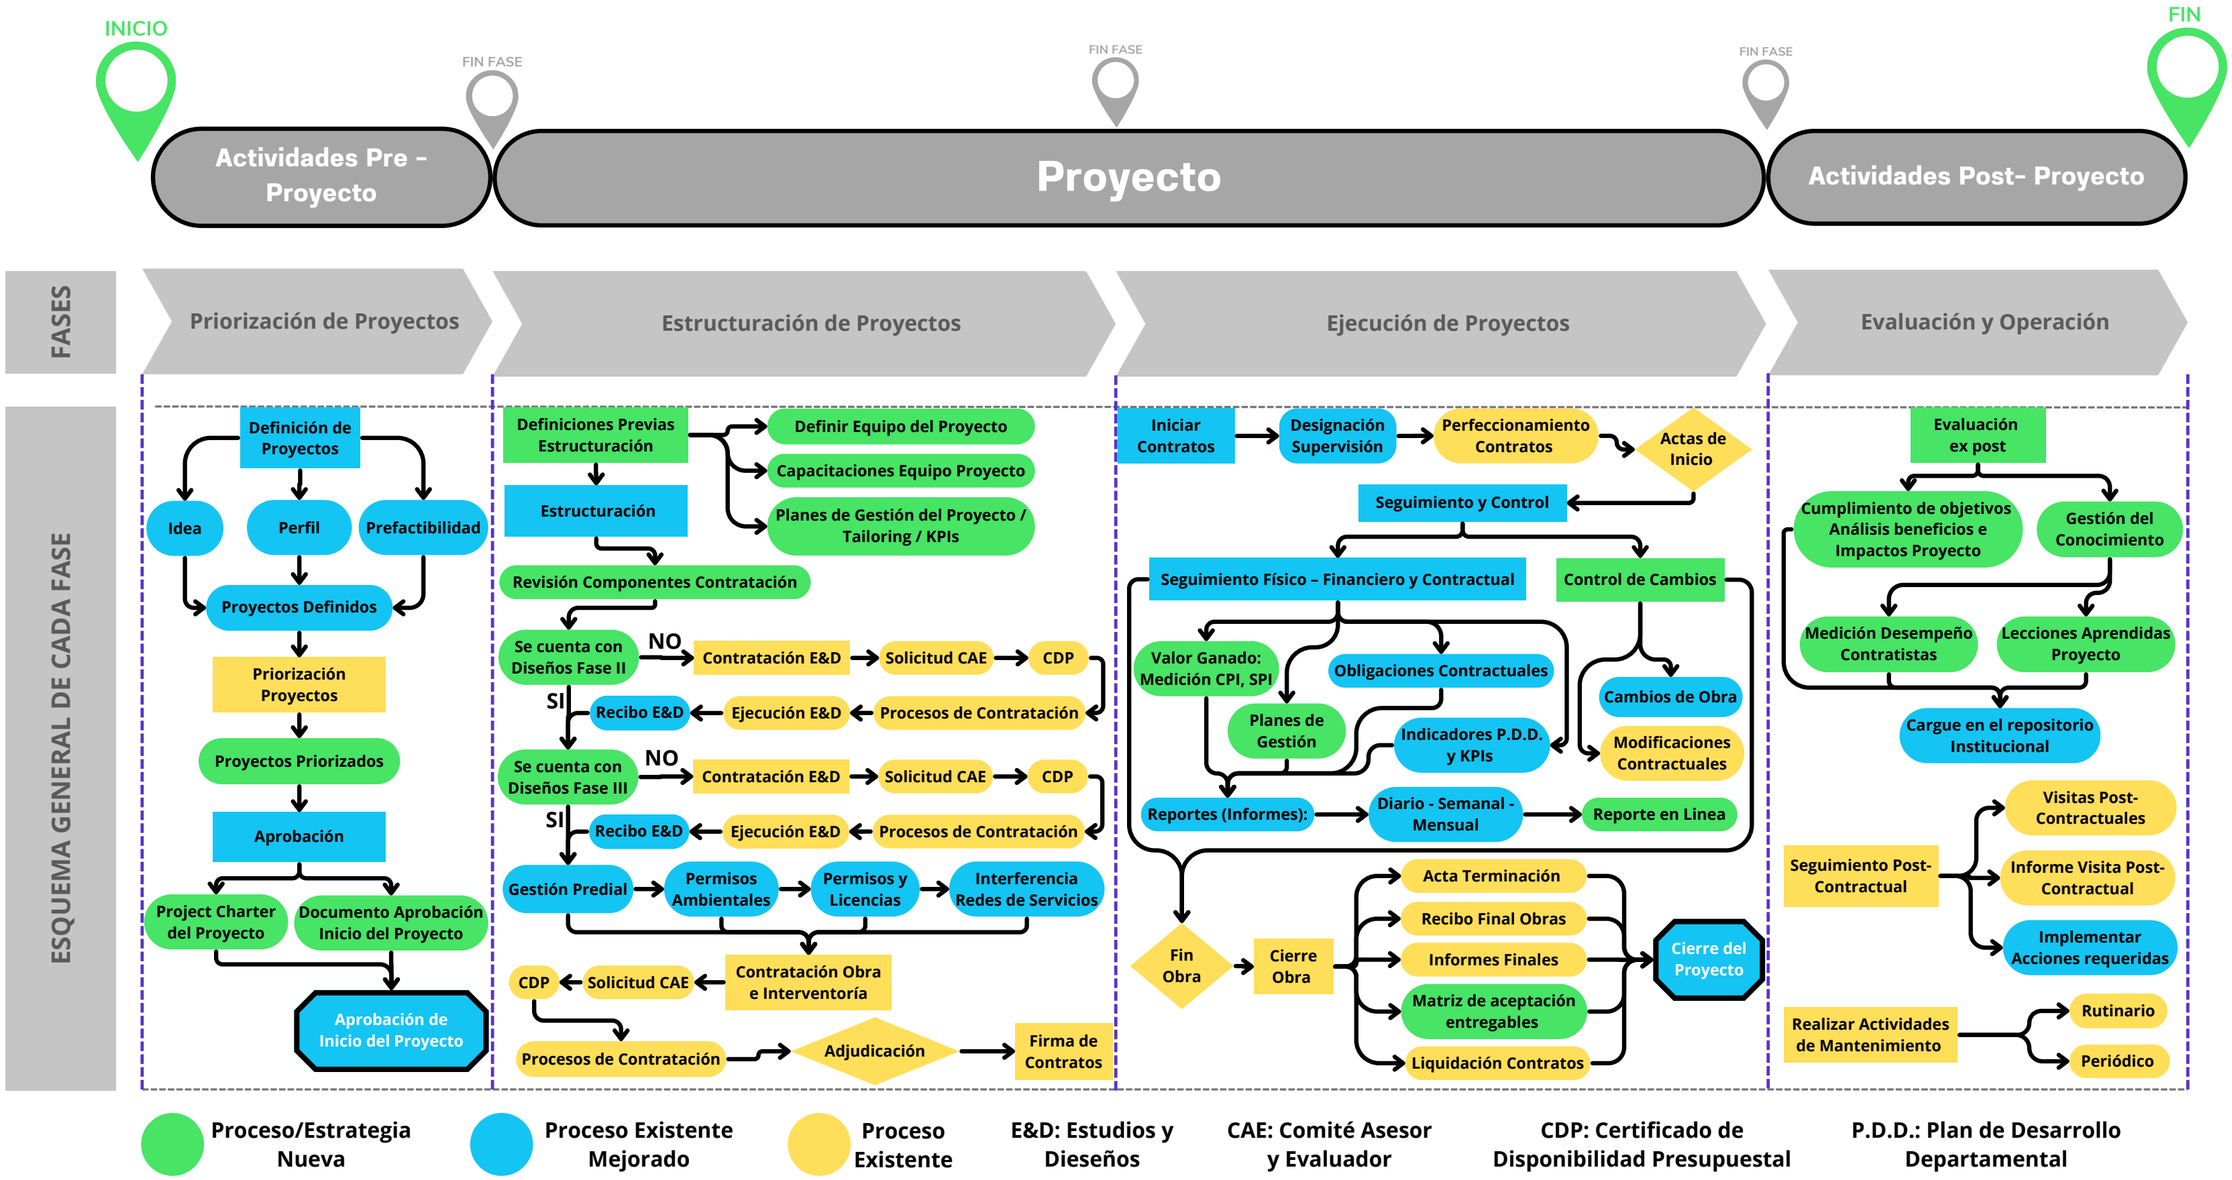
INICIO
FIN FASE
FIN FASE
FIN FASE
FIN
Actividades Pre - Proyecto
Proyecto
Actividades Post- Proyecto
FASES
Priorización de Proyectos
Estructuración de Proyectos
Ejecución de Proyectos
Evaluación y Operación
ESQUEMA GENERAL DE CADA FASE
Definición de Proyectos
Idea
Perfil
Prefactibilidad
Proyectos Definidos
Priorización Proyectos
Proyectos Priorizados
Aprobación
Project Charter del Proyecto
Documento Aprobación Inicio del Proyecto
Aprobación de Inicio del Proyecto
Definiciones Previas Estructuración
Definir Equipo del Proyecto
Capacitaciones Equipo Proyecto
Planes de Gestión del Proyecto / Tailoring / KPIs
Estructuración
Revisión Componentes Contratación
Se cuenta con Diseños Fase II
NO
Contratación E&D
Solicitud CAE
CDP
SI
Recibo E&D
Ejecución E&D
Procesos de Contratación
Se cuenta con Diseños Fase III
NO
Contratación E&D
Solicitud CAE
CDP
SI
Recibo E&D
Ejecución E&D
Procesos de Contratación
Gestión Predial
Permisos Ambientales
Permisos y Licencias
Interferencia Redes de Servicios
Contratación Obra e Interventoría
CDP
Solicitud CAE
Procesos de Contratación
Adjudicación
Firma de Contratos
Iniciar Contratos
Designación Supervisión
Perfeccionamiento Contratos
Actas de Inicio
Seguimiento y Control
Seguimiento Físico – Financiero y Contractual
Control de Cambios
Valor Ganado: Medición CPI, SPI
Obligaciones Contractuales
Planes de Gestión
Indicadores P.D.D. y KPIs
Cambios de Obra
Modificaciones Contractuales
Reportes (Informes):
Diario - Semanal - Mensual
Reporte en Linea
Fin Obra
Cierre Obra
Acta Terminación
Recibo Final Obras
Informes Finales
Matriz de aceptación entregables
Liquidación Contratos
Cierre del Proyecto
Evaluación ex post
Cumplimiento de objetivos Análisis beneficios e Impactos Proyecto
Gestión del Conocimiento
Medición Desempeño Contratistas
Lecciones Aprendidas Proyecto
Cargue en el repositorio Institucional
Seguimiento Post-Contractual
Visitas Post-Contractuales
Informe Visita Post-Contractual
Implementar Acciones requeridas
Realizar Actividades de Mantenimiento
Rutinario
Periódico
Proceso/Estrategia Nueva
Proceso Existente Mejorado
Proceso Existente
E&D: Estudios y Dieseños
CAE: Comité Asesor y Evaluador
CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal
P.D.D.: Plan de Desarrollo Departamental
